

Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää

PAAVOLATALO TYÖMAATIEDOTE

Paavolatalon rakennustyöt etenevät aikataulussa

Liikuntahallin katon sääsuojan asennus on käynnissä. Rakennuksen sisällä liikuntahallin lattia betonivalut ovat alkamassa. Päiväkodin puolella ovat väliseinät pitkällä. Seinien laatoitus, tasoitus- ja maalaustyöt ovat käynnissä.



Sääsuojan asennus liikuntahallin päälle on käynnissä



Lämmöneristeiden asennus liikuntahallin katolla alkaa, kun sääsuoja on asennettu

Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää



Pintahuovan asennus päiväkodin katolla on käynnissä



Liikuntasalin lattiavalut ovat alkamassa

Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää



Laatoitustyöt ovat käynnissä



Väliseinätyöt ovat käynnissä

Oraskatu 7, 05880 Hyvinkää



Tasoiitus- ja maalaustyöt ovat käynnissä



Paavolataloon kuuluu liikuntahalli ja päiväkot.

Rakennusaika on 7 /2024–7 /2025.

Paavolan koulun pihat tehdään syksyllä 2025 ennen koulujen alkamista

Työmaaliikenne tapahtuu pääosin Oraskadun kautta ja se jatkuu koko rakentamisen ajan

Rakentavin terveisin

YIT Business Premises Oy

YIT Business Premises Oy
Työmaasuunnitelma
Paavolatalo
FIC10634

1. Kulku työmaalle (pyöröportti)

2. Työmaatoimisto ja sosiaalitilat

3. Varastokontit ja jäteastiat

4. EA- piste, alkusammutusvälineet

5. Kokoontumispaikka

6. Varastoalue

7. Työmaatie

8. Työmaan pääkeskus

9. Pihavalaistus

10. Nostopaikka(t) ja pumppaus


11. Työmaa-aita

12. Graffitiseinä

P. Ajoportti työmaalle



Työmaatoimisto

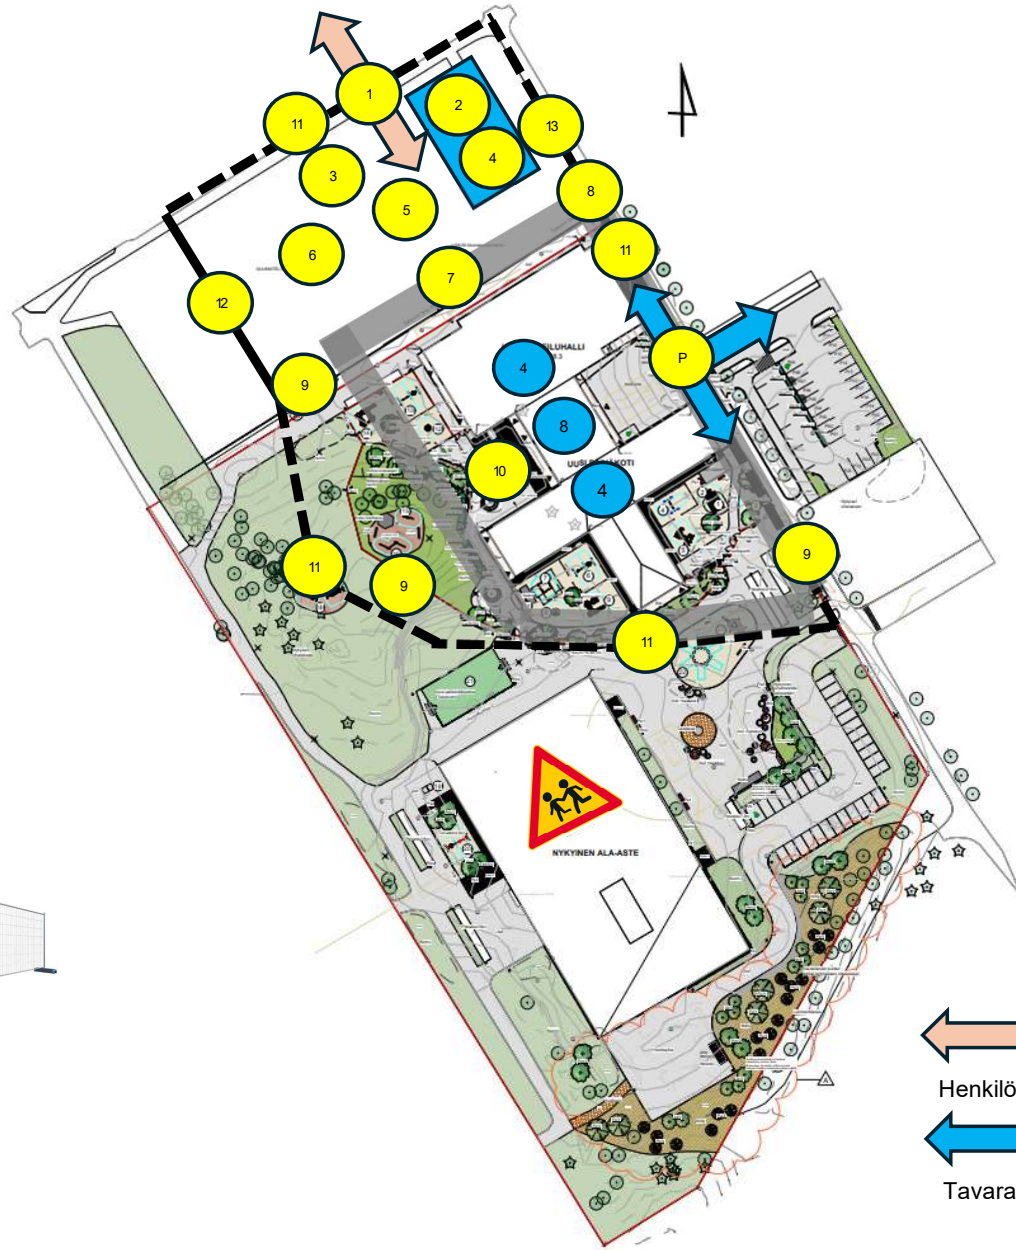

Henkilöliikenne



Tavaraliikenne
